

# Ciência da Computação

# Relatório Scrum Equipe Portugol S2

André Gustavo Cândido da Silva George Dantas da Cruz Junior Guilherme Teixeira dos Santos Luciano Douglas Machado Chagas Luis Fernando Dantas Gois Samuel Silva de Oliveira Pablo Vinícius Chaves Cortes

### Aracaju, 2020

### Relatório Scrum

Relatório destinado à disciplina laboratório de engenharia de software, orientado pelo Prof. Fábio Gomes, tendo como objetivo pontuar as etapas do processo de desenvolvimento.

# Sumário

1. Introdução	3
2. Divisão do projeto	3
<ol><li>Histórias de usuário</li></ol>	3
4. Etapas	4
5. Gráficos de BurnDown, BurnUp e Git	7
6. Desafios	g
7. Pontos positivos e negativos	10
8. Tarefas	10
9. Conclusão	12

### 1. Introdução

Este documento tem como base a descrição da aplicação da metodologia ágil Scrum nos processos de projeto de elaboração de software, que consiste no desenvolvimento de uma aplicação desktop para um hospital universitário utilizando a linguagem de programação C# e banco de dados MySql, onde também é utilizado o padrão de arquitetura MVC.

### 2. Divisão do projeto

A divisão do projeto pôde ser realizada em sala de aula. Foi dito por cada integrante da equipe as facilidades e dificuldades que cada um tinha. Então a divisão se deu da seguinte forma: Responsáveis pelo frontend ficaram André, Samuel e Pablo; Pelo backend Luis, Guilherme e Luciano; A parte de integração do frontend e backend ficou responsável George e, os testes, Luciano.

#### 3. Histórias de Usuários

A elaboração das histórias de usuário foi possível com a participação da maioria dos integrantes do grupo, sendo que cada integrante pontuou e, a nota obtida ficou sendo a que mais se aproximava da nota que cada um escolheu.

Histórias de usuário		
Descrição	Nota	
Como usuário, quero me autenticar para ter acesso ao sistema	3	
Como administrador, quero gerir os usuários do sistema	13	
Como recepcionista, quero gerir os pacientes que irão se consultar	5	
Como médico, quero emitir um pedido de exame	2	

Como residente, quero interpretar e fazer uploads das imagens dos exames realizados	13
Como residente, quero emitir um laudo	8
Como docente, quero confirmar um laudo	5
Como médico, quero visualizar os exames com laudos confirmados	8

# 4. Etapas

Na tabela abaixo segue as atividades e a data de finalização.

Atividade	Responsável	Situação	Data
Escolha da Linguagem e Banco de dados	Todos	Entregue	28/01/2020
Divisão do Projeto	Todos	Entregue	04/02/2020
Elaboração das histórias de usuário	Todos	Entregue com atraso	14/02/2020
Elaboração do modelo lógico	Luis e Luciano	Entregue	14/02/2020
Elaboração do protótipo	Lucas	Não Entregue	18/02/2020
Implementação das classes de domínio	Luciano	Entregue	01/03/2020
Implementação da Camada de Infra	Luis	Entregue	03/03/2020
Implementação do repositório do sistema	Luis	Entregue	10/03/2020
Elaboração das telas iniciais do sistema	André	Entregue	10/03/2020
Implementação do Controlador da Entidade Usuário	Guilherme	Entregue	10/03/2020

Implementação da validação de dados do usuário no cadastro	Luis	Entregue	14/03/2020
Integração entre a tela de login e o backend	George	Entregue	14/03/2020
Implementação do controlador da entidade recepcionista	guilherme	Entregue	24/03/2020
Implementação do controlador da entidade administrador	guilherme	Entregue	24/03/2020
Implementação do controlador da entidade exame	Luis	Entregue	24/03/2020
Implementação do controlador da entidade médico	Luis	Entregue	24/03/2020
Implementação das telas de CRUD da entidade médico	André	Entregue	24/03/2020
Implementação da tela de menu principal do administrador do sistema	André	Entregue	24/03/2020
Implementação das telas de CRUD da entidade Recepcionista	Samuel	Entregue/atraso	24/03/2020
Implementação das telas de CRUD da entidade Exame	Samuel	Entregue/atraso	24/03/2020
Implementação das telas de CRUD da Entidade Administrador	Pablo	Entregue/atraso	24/03/2020
Integração frontend do crud da entidade médico com o backend	George	Entregue/atraso	24/03/2020
Integração frontend da tela de menu principal do administrador com o seu backend	George	Entregue/atraso	24/03/2020
Integração frontend do crud da entidade Administrador com o back	George	Entregue/atraso	21/04/2020


Integração frontend do crud da entidade Recepcionista com o seu backend	George	Entregue/atraso	21/04/2020
Integração do frontend do crud da entidade Exame com o seu backend	George	Entregue/atraso	21/04/2020
Implementação do repositório da entidade Cliente	Luiz	Entregue	05/05/2020
Validações dos dados.	Luiz	Entregue	05/05/2020
Implementação do Controlador da entidade Paciente	Guilherme	Entregue	05/05/2020
Implementação do Menu Principal de Recepcionista	André	Entregue	02/05/2020
Implementação da tela de detalhes de um paciente	André	Entregue	02/05/2020
Integração da tela de detalhes com a parte respectiva do backend	George	Entregue	05/05/2020
Integração da tela de cadastro do paciente com a parte respectiva do backend	George	Entregue	05/05/2020
Integração da tela de listagem com a parte respectiva do backend	George	Entregue	05/05/2020
Integração da Tela de Pedido de Exame	George	Entregue	12/05/2020
Tela de solicitação de um pedido de exame	André	Entregue	12/05/2020
Tela para atualizar a data de realização de um exame	André	Entregue	12/05/2020
Implementação do repositório de pedido exame	Guilherme	Entregue	12/05/2020
Validação de dados de um pedido exame	Guilherme	Entregue	12/05/2020

Implementação controlador de pedido exame	Luiz	Entregue	12/05/2020
Integração da tela para atualizar a data de realização de um exame	George	Entregue	12/05/2020

### 5. Gráficos BurnDown, BornUp e Git


Neste gráfico vemos a linha em tom verde claro representando a demanda de trabalho a ser realizada e a de azul o que realmente foi feito.

BurnDown

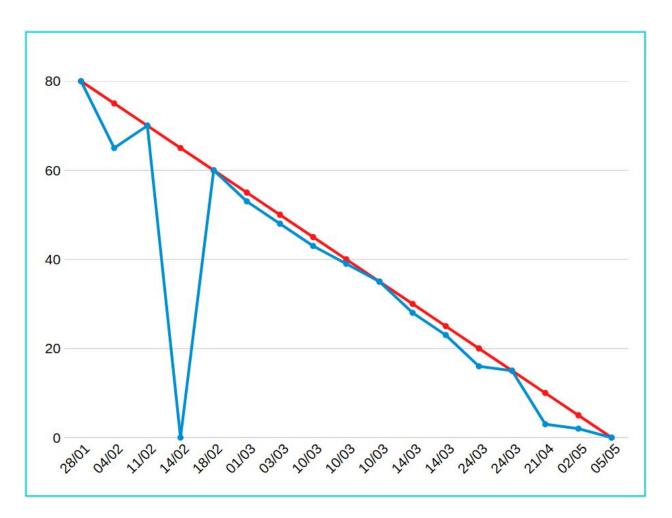


No gráfico de burnup revela o quanto de progresso já ocorreu enquanto a linha sobe em direção ao ponto final. A linha ideal é representada pela reta, que vai desde o início do projeto até o ponto final.

### BurnUp

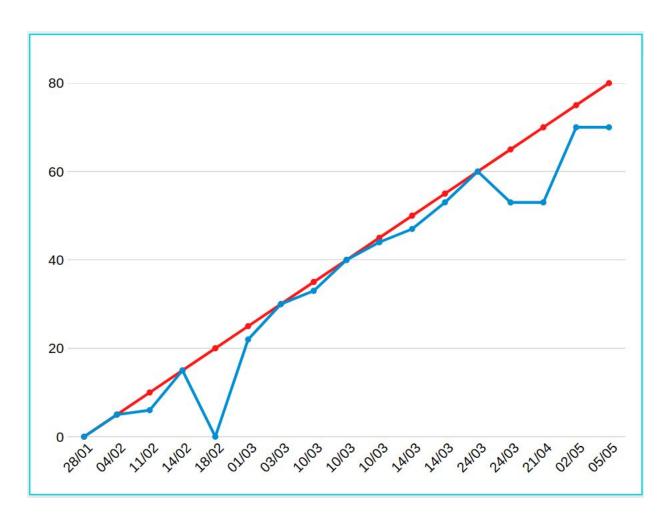

Neste gráfico abaixo pode-se observar a participação dos integrantes em relação aos commits durante o desenvolvimento das atividades.

#### GitHub

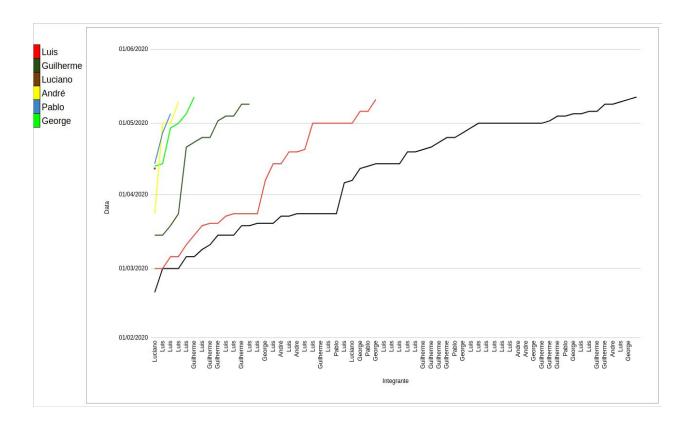

### 6. Desafios

Um dos maiores desafios encontrados foi a falta de experiência da equipe para esse tipo de atividade e, como consequência surgiram problemas de planejamento e gerenciamento das atividades o que acarretou alguns problemas como, atraso em algumas atividades e até mesmo falta de comprometimento de alguns integrantes.

Logo no início, o time ainda não estava bem sincronizado e a falta de comunicação atrapalhou tanto o entendimento quando o andamento do projeto. Em uma das etapas foi decidido a entrega do protótipo, porém, não foi concluído pela pessoa responsável e, no dia da entrega informa que havia trancado a disciplina, não houve uma comunicação prévia para a equipe por parte dele. E com isso foi necessário a troca de Product Owner e do Scrum Master.

### 7. Pontos Positivos e Negativos

O maior ponto positivo foi que a equipe conseguiu decidir de forma rápida algumas medidas, como por exemplo, a troca do product owner e scrum master, comunicando ao professor por meio de email. Outro ponto positivo foi a equipe como um todo poder opinar sobre determinada tarefa, fazendo com isso um melhor entendimento sobre alguma parte específica.

O ponto negativo a ser mencionado é principalmente a falta de comunicação, não que esse seja um motivo de muita preocupação, mas sim a ser trabalhado, visto que acarreta no atraso de algumas atividades e entendimentos.

#### 8. Tarefas

Todo o processo de realização das tarefas foram divididos em etapas que são classificadas como: To-do (a fazer), In Progress (em andamento) e Done (feito). As tarefas são disponibilizadas aos membros e estes chamavam para si a responsabilidade de realizá-la.

Tarefa	Responsável
Criação do Modelo lógico do projeto	Luciano e Luis
Implementação das classes de domínio	Luciano
Implementação da Camada de Infra	Luis

Implementação do Repositório do Sistema	Luis
Implementação do controlador da entidade Usuário	Guilherme
Implementação da validação de dados no momento do cadastro do usuário	Luis
Elaboração da tela de login	André
Integração entre a tela de login e o backend	George
Implementação do controlador da entidade Recepcionista	Guilherme
Implementação do controlador da entidade Administrador	Guilherme
Implementação do controlador da entidade Exame	Luis
Implementação do controlador da entidade Médico	Luis
Implementação da tela de menu principal do administrador ao sistema	André
Implementação das telas de CRUD da entidade Médico	André
Implementação das telas de CRUD da entidade Exame	Samuel
Implementação das telas de CRUD da entidade Recepcionista	Samuel
Implementação das telas de CRUD da entidade Administrador	Pablo
Integração frontend do crud da entidade médico com seu backend	George
Integração frontend da tela de menu principal do administrador com o seu backend	George
Integração frontend do crud da entidade Exame com o backend	George
Integração frontend do crud da entidade Recepcionista como seu backend	George
Integração frontend do crud da entidade Administrador com o seu backend	George
Implementação do repositório da entidade Paciente	Luiz
Validação dos dados	Luiz
Implementação do controlador da entidade Paciente	Guilherme
	1

André
André
George
George
George
George
André
André
Guilherme
Guilherme
Luiz
George

### 9. Conclusão

O uso da abordagem Scrum vem permitindo em nosso projeto uma melhor organização (mesmo que não por completo) e acompanhamento das fases vividas, o que mostra de forma clara a importância do mesmo. Pôde-se, também, observar o comprometimento de alguns integrantes da equipe no que se refere a prazos de entrega podendo acarretar em acúmulos de atividade, fazendo com que algumas atividades que deveriam estar sendo processadas, fiquem paradas.
